

# **DÜZCE**

**İL MİLLİ EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 YILI YATIRIMLARI  
(22 Proje)**

**2018**

SIRA NO	PROJE ADI	DURUMU
1	Akçakoca İmam Hatip Lisesi (16 Derslik)	Tamamlandı
2	Akçakoca Dilek Horoz Anaokulu (5 Derslik )	Tamamlandı
3	Merkez Anadolu Lisesi (Gümüşpınar) (32 Derslik)	Devam ediyor
4	Merkez Anadolu Lisesi (24 Derslik)	Devam ediyor
5	Merkez Atölye (Borsa İstanbul)	İhale aşamasında
6	Merkez Bahçeköy İlkokulu (4 Ek Derslik)	Tamamlandı
7	Çilimli Anadolu Lisesi (12 Derslik)	Arsa tahsis aşamasında
8	Çilimli İbrahim Hoşver Kapalı İlkokulu Spor Salonu	İhalesi yapıldı
9	Merkez DEPO	Tamamlandı
10	Merkez Düzce Anaokulu (5 Derslik )	Sözleşme imzalandı
11	Gümüşova Ortaokulu (16 Derslik)	Zemin etüdü yapılmakta
12	Merkez Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Merkezi	Devam ediyor
13	Kaynaşlı Anaokulu (6 Derslik )	İmar tadilatı bekleniyor
14	Kaynaşlı İmam Hatip Lisesi (12 Derslik)	Devam ediyor
15	Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Güçlendirme)	Tamamlandı
16	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi +Konferans Salonu (24 Derslik)	Devam ediyor
17	Merkez Namık Kemal İlkokulu (32 Derslik)	Devam ediyor
18	Merkez Necmi Hoşver Ortaokulu (8 Derslik )	Sözleşme imzalandı
19	Merkez Spor Lisesi (12 Derslik)	Devam ediyor
20	Merkez Tefik İleri İmam Hatip Ortaokulu (12 Derslik)	Tamamlandı
21	Merkez TOBB Atatürk İlkokulu (24 Derslik)	Tamamlandı
22	Yığılca İmam Hatip Lisesi (12 Derslik)	Tamamlandı
23	Merkez Bilim Sanat Merkezi	İhale aşamasında
24	Beyköy Mehmet Akip İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu Pansiyon ve Spor Salonu İkmal İnşaatı	İhale aşamasında

## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca İmam Hatip Lisesi (16 Derslik)

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2015 - 2018

**Proje Bedeli** : 5.500.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : -

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : Eğitim Öğretime Açıldı



## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Akçakoca Dilek Horoz Anaokulu (5 Derslik)
Projenin Yeri	: Düzce / Akçakoca
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2018
Proje Bedeli	: 650.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Eğitim Öğretime Açıldı





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Anadolu Lisesi (Gümüşpınar) (32 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2019
Proje Bedeli	: 9.500.000 TL
İhale Bedeli	: 9.045.880 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 4.724.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 692.682 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 15
Projenin Son Durumu	: İhalesi 17.08.2017 tarihinde yapılan proje devam etmektedir.








## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Anadolu Lisesi (24 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2013 - 2018
Proje Bedeli	: 8.500.000 TL
İhale Bedeli	: 7.341.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 8.500.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 3.032.763 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 60
Projenin Son Durumu	: Devam ediyor.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Merkez Atölye (Borsa İstanbul)
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2016 - 2018
Proje Bedeli	: 2.500.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.597.492 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: 12.02.2018 tarihinde ihalesi yapılacak.

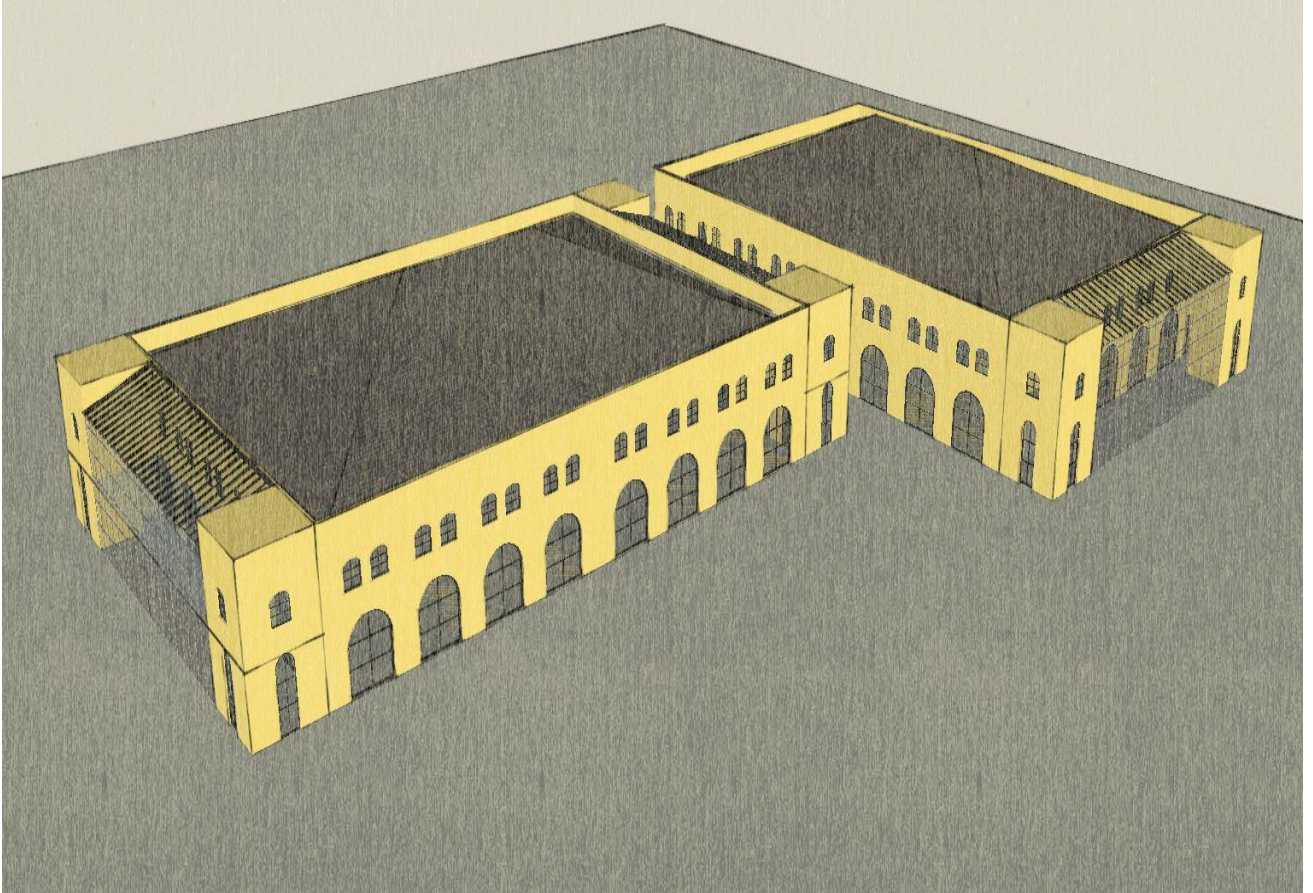



## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Bahçeköy İlkokulu (4 Ek Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2017
Proje Bedeli	: 1.109.000 TL
İhale Bedeli	: 940.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 515.295 TL
2017 Yılı Harcaması	: 424.704 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Çilimli Anadolu Lisesi (12 Derslik)

**Projenin Yeri** : Düzce / Çilimli

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2017 - 2019

**Proje Bedeli** : 5.500.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 550.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : -

**Projenin Son Durumu** : Okulun yapımı için tespit edilen arsa da zemin etüt yapılmıştır. Ancak zeminin dolgu ve yumuşak olması nedeniyle arsa değişikliğine gidilmiş olup, yeni arsa tespit çalışmaları tamamlanmış olup, arsanın tahsisi bekleniyor.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Çilimli İbrahim Hoşver Kapalı İlkokulu Spor Salonu</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Çilimli
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2018
Proje Bedeli	: 1.180.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.180.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: 25.01.2018 tarihinde ihalesi yapıldı.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez DEPO</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2017
Proje Bedeli	: 1.070.000 TL
İhale Bedeli	: 906.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.070.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 1.070.000 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı



## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Düzce Anaokulu (5 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2018
Proje Bedeli	: 1.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Sözleşme imzalandı.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Gümüşova Ortaokulu (16 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Gümüşova
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2018
Proje Bedeli	: 8.500.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 3.663.198 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Zemin etüd çalışmaları yapılmaktadır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Merkez Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Merkezi

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2015 - 2018

**Proje Bedeli** : 3.000.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : -

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 35

**Projenin Son Durumu** : Devam ediyor.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Kaynaşlı Anaokulu (6 Derslik)

**Projenin Yeri** : Düzce / Kaynaşlı

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2017 - 2018

**Proje Bedeli** : 2.592.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 1.250.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : -

**Projenin Son Durumu** : Mevcut arsanın büyütülmesi ile ilgili imar tadilatı yapılmaktadır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Kaynaşlı İmam Hatip Lisesi (12 Derslik)
Projenin Yeri	: Düzce / Kaynaşlı
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2016 - 2018
Proje Bedeli	: 4.900.000 TL
İhale Bedeli	: 4.970.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 3.575.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.309.104 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 60
Projenin Son Durumu	: Devam ediyor.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : **Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü**  
**(Güçlendirme)**

**Projenin Yeri** : **Düzce / Merkez**

**Başlama - Bitiş Tarihi** : **2015 - 2017**

**Proje Bedeli** : **1.026.600 TL**

**İhale Bedeli** : **870.000 TL**

**Önceki Yıllar Harcaması** : **-**

**2017 Yılı Ödeneği** : **870.000 TL**

**2017 Yılı Harcaması** : **924.980 TL**

**Fiziki Gerçekleşmesi** : **% 100**

**Projenin Son Durumu** : **Tamamlandı.**



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik)  
+ Konferans Salonu

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2015 - 2018

**Proje Bedeli** : 10.000.000 TL

**İhale Bedeli** : 9.360.704 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 10.000.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 3.359.989 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 50

**Projenin Son Durumu** : Devam ediyor.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Namık Kemal İlkokulu (32 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2019
Proje Bedeli	: 10.000.000 TL
İhale Bedeli	: 10.061.860 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 5.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 835.451 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: %20
Projenin Son Durumu	: İnşaat Devam Ediyor.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Merkez Necmi Hoşver Ortaokulu (8 Derslik)

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez

**Başlama - Bitiş Tarihi** : 2017 - 2018

**Proje Bedeli** : 4.000.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 3.000.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : -

**Projenin Son Durumu** : İhalesi yapılmış olup, 5.02.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Merkez Spor Lisesi (12 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2014 - 2019
Proje Bedeli	: 6.750.000 TL
İhale Bedeli	: 6.475.781 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 5.250.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 799.995 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 40
Projenin Son Durumu	: Devam ediyor



## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Merkez Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu (12 Derslik)
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2018
Proje Bedeli	: 6.000.000 TL
İhale Bedeli	: 4.782.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 4.782.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 4.726.631 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı





## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Merkez TOBB Atatürk İlkokulu (24 Derslik)
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2018
Proje Bedeli	: -
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Eğitim Öğretime Açıldı.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Yığılca İmam Hatip Lisesi (12 Derslik)</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Yığılca
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2017
Proje Bedeli	: 5.500.000 TL
İhale Bedeli	: 4.485.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 2.482.643 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 2.029.182 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.029.182 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Merkez Bilim Sanat Merkezi
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 8.500.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 850.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: İhale aşamasındadır.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Beyköy Mehmet Akip İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu Pansiyon ve Spor Salonu İkmal İnşaatı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>: Düzce / Merkez</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>: 2017 - 2019</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 5.885.656 TL</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>: -</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: -</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 5.885.656 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: -</b>
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>: -</b>
<b>Projenin Son Durumu</b>	<b>: İhale aşamasındadır.</b>

